



AYUDA

Manual de uso

Guía completa para aprender el sistema desde cero: obras, campo, compras, inventario y tesorería.

Tip: usá el índice para saltar. Las capturas son pantallas reales del sistema.

Índice

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Primeros pasos | 9. Punch List (observaciones) |
| 2. Obras (proyectos) | 10. Documentos |
| 3. Clientes y proveedores (catálogo) | 11. Compras (facturas de proveedor) |
| 4. Presupuesto | 12. Inventario |
| 5. Certificaciones de avance | 13. Tesorería: recibos y órdenes de pago |
| 6. Órdenes de cambio (ODC) | 14. Caja diaria y caja tesorería |
| 7. Cronograma (Gantt) | 15. Configuración de la empresa |
| 8. Parte diario | 16. Flujo recomendado del día a día |



1. Primeros pasos

Al entrar vas al Inicio. El menú izquierdo (en celular, el botón de menú) concentra lo de la empresa; cada obra tiene su propio menú interno.


Cómo hacerlo

1. Abrió el sistema en el navegador e iniciá sesión (o usá el acceso de desarrollo si te lo configuraron).
2. En Inicio vas a ver accesos rápidos según tu rol (Administrador, Dirección, Residente, etc.).
3. Usá el menú lateral: Obras, Tesorería, Clientes, Proveedores y Configuración.
4. Para trabajar una obra concreta: entrá a Obras y abrí la que corresponda.

TIPS

Si no ves un módulo, probablemente tu rol no lo habilita. Pedile a un administrador que revise tu permiso.

Los montos en ARS y USD no se mezclan: siempre se informan por moneda.

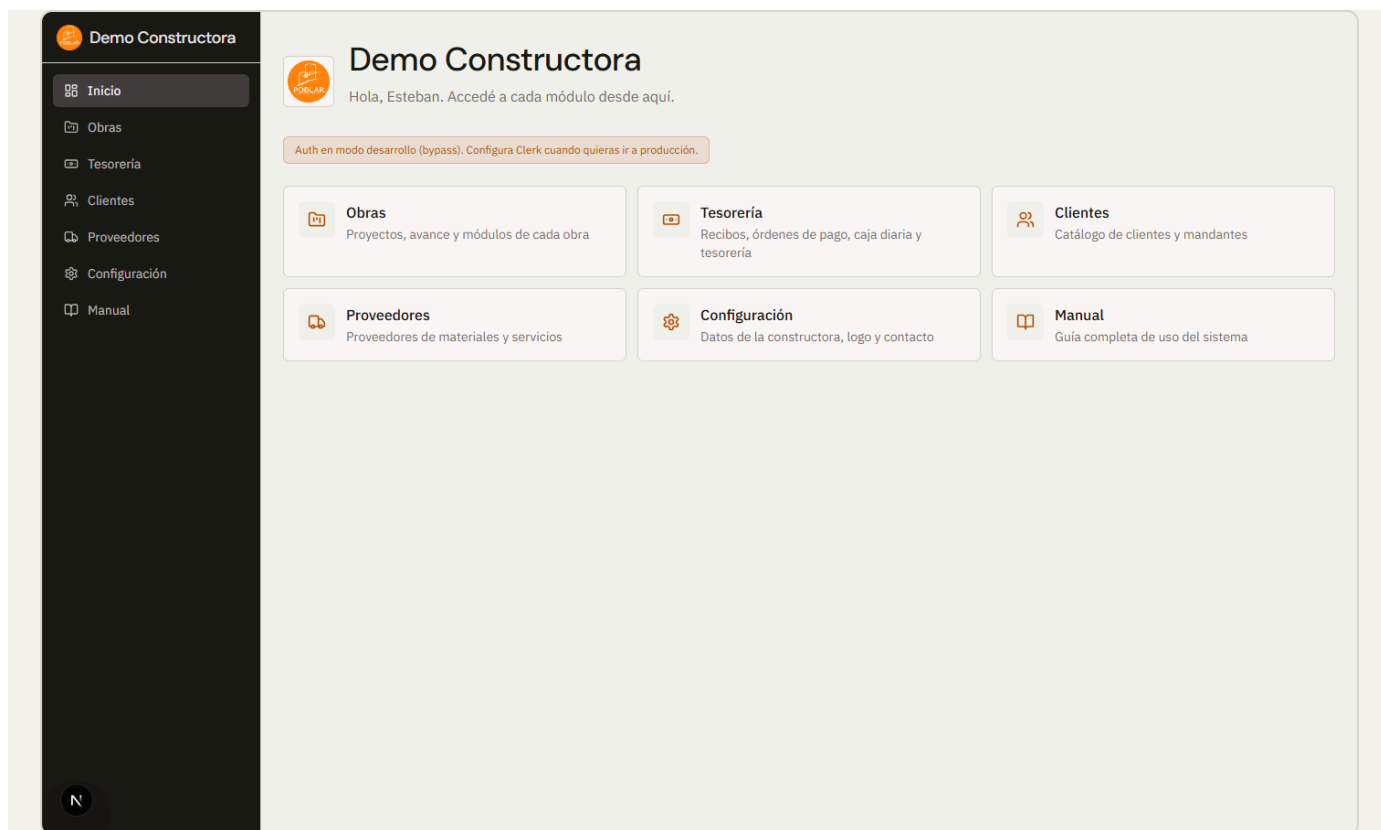

Inicio — panel principal



2. Obras (proyectos)

Una obra es el centro de todo: presupuesto, partes, compras y documentos viven dentro de ella.

Cómo hacerlo

1. Andá a Obras en el menú.
2. Para crear: botón Nueva obra → completá código (único), nombre, ciudad y cliente opcional.
3. Hacé clic en una obra de la lista para abrir su Resumen.
4. Desde el Resumen usá los accesos rápidos o el menú de la obra (Presupuesto, Parte diario, etc.).
5. Eliminar obra (solo Admin/Dirección): en Resumen → Eliminar obra. Solo funciona si la obra no tiene datos cargados (presupuesto, partes, facturas, etc.).

TIPS

El código de obra no se puede repetir en la misma empresa.

Si no podés eliminar, el sistema te indica qué datos lo bloquean.

Demo Constructora

Inicio

Obras

Tesorería

Clientes

Proveedores

Configuración

Manual

N

Obras

Selecciona una obra para gestionar presupuesto, campo y logística.

+ Nueva obra

OB-2026-001

Edificio Los Alerces

Santiago · Inmobiliaria Los Andes SpA

Activa

Avance

42%

OB-2026-002

Remodelación Costanera

Viña del Mar · Retail Costanera S.A.

Activa

Avance

18%

OB-2025-014

Bodega Industrial Maipú

Maipú · Logística Maipú Ltda.

En pausa

Avance

67%

Listado de obras

Demo Constructora

Inicio

Obras

Tesorería

Clientes

Proveedores

Configuración

Manual

N

Obras

OB-2026-001

Edificio Los Alerces

Santiago · Inmobiliaria Los Andes SpA · Activa

Resumen

Cliente y proveedores

Presupuesto

Certificaciones

Órdenes de Cambio

Cronograma

Parte Diario

Punch List

Documentos

Resumen

Eliminar obra

Solo se puede eliminar si no hay datos cargados. Ahora tiene: 1 presupuestos, 3 tareas de cronograma, 2 proveedores vinculados.

CLIENTE

Inmobiliaria Los Andes ...

Mandante

COBRADO DEL CLIENTE

\$ 0,00

Recibos imputados

PRESUPUESTO

\$ 17.775.000,00

Estimado

PROVEEDORES

2

Vinculados

Presupuesto estimado: \$ 17.775.000,00. El cobro se informa por moneda (ARS / USD) sin mezclar.

Accesos rápidos

Cliente y proveedores

Asigná mandante y proveedores de la obra

Certificaciones

Avance por partida y retenciones (documento interno)

Presupuesto

Partidas, estimado vs real y control financiero

Parte Diario

Personal, clima, máquinas e incidencias del día

Punch List

Observaciones con foto, estado y responsable

Cronograma

Tareas, hitos y vista Gantt

Documentos

Contratos, planos, especificaciones e informes

Compras

Facturas de proveedor con desglose automático

Inventario

Stock por categoría y consumo del día

Resumen de obra — cobros, presupuesto y accesos



3. Clientes y proveedores (catálogo)

Primero cargás el catálogo de la empresa; después los vinculás a cada obra.

Cómo hacerlo

1. Clientes: menú Clientes → alta con nombre, CUIT/tax ID, contacto.
2. Proveedores: menú Proveedores → misma idea (materiales o servicios).
3. Dentro de la obra → Cliente y proveedores: asigná el mandante y los proveedores que trabajan esa obra.

 Demo Constructora

Inicio

Obras

Tesorería

Clientes

Proveedores

Configuración

Manual

Clientes

Mandantes y contratantes que podés asignar a cada obra.



Inmobiliaria Los Andes SpA
76.111.111-1 · Ana Fuentes · ana@losandes.cl

1 obra



Logística Maipú Ltda.
77.333.333-3 · Carla Díaz · obras@logmaipu.cl

1 obra



Retail Costanera S.A.
96.222.222-2 · Pedro Núñez · compras@costanera.cl

1 obra

Catálogo de clientes

Demo Constructora

Inicio

Obras

Tesorería

Cientes

Proveedores

Configuración

Manual

N

Proveedores

Catálogo de proveedores para vincular a obras y compras.

+ Nuevo proveedor

Aceros Cordillera 79.555.555-5 · Marta Rojas	1 obra
Ferretería Industrial Andes 76.666.666-6 · Jorge Silva	2 obras
Hormigones del Sur 78.444.444-4 · Luis Pérez	2 obras

Catálogo de proveedores

Demo Constructora

Obras

Tesorería

Cientes

Proveedores

Configuración

Manual

N

← Obras

08-2026-001

Edificio Los Alerces

Santiago · Inmobiliaria Los Andes SpA · Activa

Resumen

Ciente y proveedores

Presupuesto

Certificaciones

Órdenes de Cambio

Cronograma

Parte Diario

Punch List

Docu

Ciente y proveedores

Relacioná el mandante y los proveedores de esta obra.

Ciente / Mandante

Un cliente principal por obra. Gestioná el catálogo en Cientes.

Inmobiliaria Los Andes SpA · 76.111.111-1

Proveedores de la obra

Proveedores vinculados a esta obra (además del catálogo general).

Hormigones del Sur

Principal

78.444.444-4 · hormigones

Quitar

Aceros Cordillera

79.555.555-5 · aceros

Quitar

Agregar proveedor

Rubro / notas

Seleccionar...

Hormigón, fierro...

☐ Principal

Vincular

Vinculación a la obra

4. Presupuesto

El presupuesto define las partidas. El avance certificado y los costos/ingresos reales se contrastan contra esas partidas.

Cómo hacerlo

1. Obra → Presupuesto.
2. Creá el presupuesto base y cargá partidas (código, descripción, cantidad, unidad, costo unitario).
3. Cuando esté listo: Aprobar. Luego podés Cerrar (bloquea ediciones).
4. Si hay una Orden de Cambio aprobada, el estado puede pasar a Revisado y los montos de partida se actualizan.

TIPS

Sin partidas no vas a poder certificar ni imputar bien recibos/OP a la obra.

Presupuesto cerrado (LOCKED): hay que reabrirlo si necesitás aplicar una ODC.

 Demo Constructora

Inicio

Obras

Tesorería

Clientes

Proveedores

Configuración

Manual

Obras

OB-2026-001

Edificio Los Alerces

Santiago · Inmobiliaria Los Andes SpA · Activa

Resumen

Cliente y proveedores

Presupuesto

Certificaciones

Órdenes de Cambio

Cronograma

Parte Diario

Punch List

Docu

Presupuesto

Presupuesto Base · v1 Aprobado

Emitir en Tesorería

ESTIMADO

\$ 17.775.000,00

COBRADO DEL CLIENTE

\$ 0,00

COSTO REAL (OP)

\$ 0,00

VARIACIÓN COSTO

-100.0%

Partidas

Cerrar

+ Agregar partida

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UD.	P. UNIT.	ESTIMADO	COSTO REAL	INGRESO REAL	
01-01	Excavación y movimiento de suelos	120	m³	\$ 18.500,00	\$ 2.220.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	 
01-02	Hormigón fundaciones H25	85	m³	\$ 95.000,00	\$ 8.075.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	 
02-01	Muro albañilería 15 cm	340	m²	\$ 22.000,00	\$ 7.480.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	 

Presupuesto — partidas y control



5. Certificaciones de avance

Documento interno de avance por % de partida (no es factura ARCA). Sirve para documentar lo ejecutado en un período.

Cómo hacerlo

1. Obra → Certificaciones → Nueva certificación.
2. Definí período, retención de garantía (%) y marcá las partidas con el % acumulado del período.

3. Guardá → Presentar → Aprobar → opcionalmente Marcar liquidada.

4. Podés rechazar o eliminar borradores según el estado.

TIPS

Estados: Borrador → Presentada → Aprobada → Liquidada (o Rechazada).

El neto = bruto – retención.

The screenshot shows the 'Demo Constructora' web application. On the left is a dark sidebar with a menu: Inicio, Obras (selected), Tesorería, Clientes, Proveedores, Configuración, and Manual. The main area has a header with 'Obras', 'OB-2026-001', and 'Edificio Los Alerces' (Santiago · Inmobiliaria Los Andes SpA · Activa). Below the header is a navigation bar with icons for Resumen, Cliente y proveedores, Presupuesto, Certificaciones (active), Órdenes de Cambio, Cronograma, Parte Diario, Punch List, and Documentos. The 'Certificaciones' section displays 'Documentos internos de avance de obra (sin facturación ARCA)'. It features two summary boxes: 'NETO APROBADO / LIQUIDADO' with a value of '\$ 0,00' and 'DOCUMENTOS' with a value of '0'. A large dashed box contains the text: 'Todavía no hay certificaciones. Creá la primera para documentar el avance.' A '+ Nueva certificación' button is in the top right.

Certificaciones de la obra



6. Órdenes de cambio (ODC)

Registran extras o ajustes contractuales. Al aprobarlas, impactan el presupuesto.

Cómo hacerlo

1. Obra → Órdenes de cambio → Nueva ODC.
2. Completá título, descripción y líneas de impacto (partida opcional, Δ cantidad, Δ costo, Δ monto).
3. Queda Pendiente hasta que Dirección/Admin Apruebe o Rechace.
4. Si se aprueba con partidas vinculadas, el presupuesto se marca Revisado.

Demo Constructora

Inicio

Obras

Tesorería

Clientes

Proveedores

Configuración

Manual

← Obras

OB-2026-001

Edificio Los Alerces

Santiago · Inmobiliaria Los Andes SpA · Activa

Resumen

Cliente y proveedores

Presupuesto

Certificaciones

Órdenes de Cambio

Cronograma

Parte Diario

Punch List

Docu

Órdenes de cambio

Impacto contractual sobre el presupuesto. Al aprobar se actualizan las partidas.

IMPACTO APROBADO

CLP 0

PENDIENTES

0

+ Nueva ODC

Todavía no hay órdenes de cambio.


Órdenes de cambio

7. Cronograma (Gantt)

Planificá tareas e hitos con fechas y dependencias simples.

Cómo hacerlo

1. Obra → Cronograma.
2. Creá tareas o hitos con fechas de inicio/fin.
3. Actualizá el estado (no iniciada, en proceso, completada, etc.).
4. Usá la vista Gantt para ver la secuencia en el tiempo.

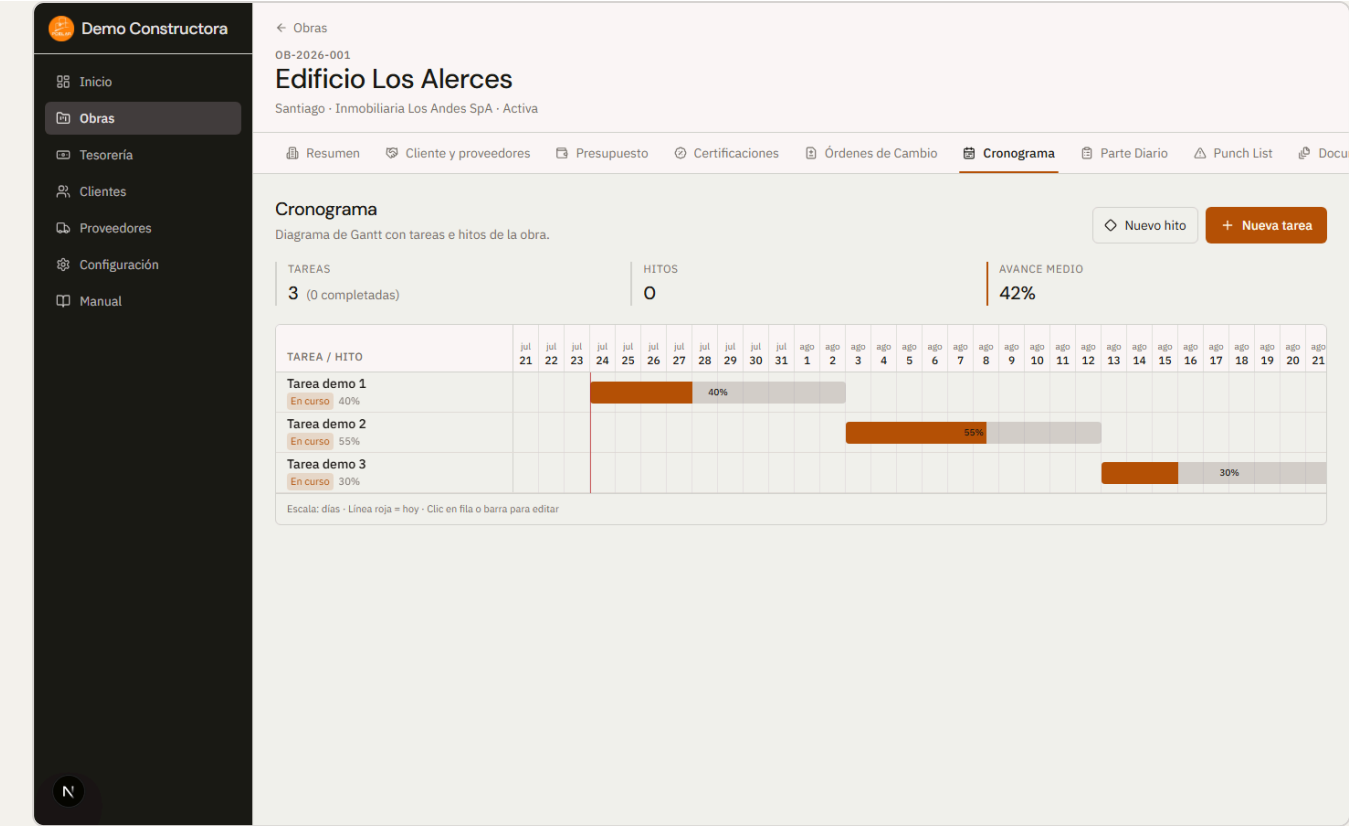

Cronograma



8. Parte diario


Registro de lo que pasó en obra ese día: personal, clima, máquinas, incidencias y notas libres.

Cómo hacerlo

1. Obra → Parte diario → Nuevo parte.
2. Completá las secciones del día (podés dejar notas por sección o por fila).
3. Guardá. Después podés reabrir el parte desde el listado para editarlo.

TIPS

Es el módulo pensado para uso en campo (celular o tablet).
Conviene un parte por día de obra.

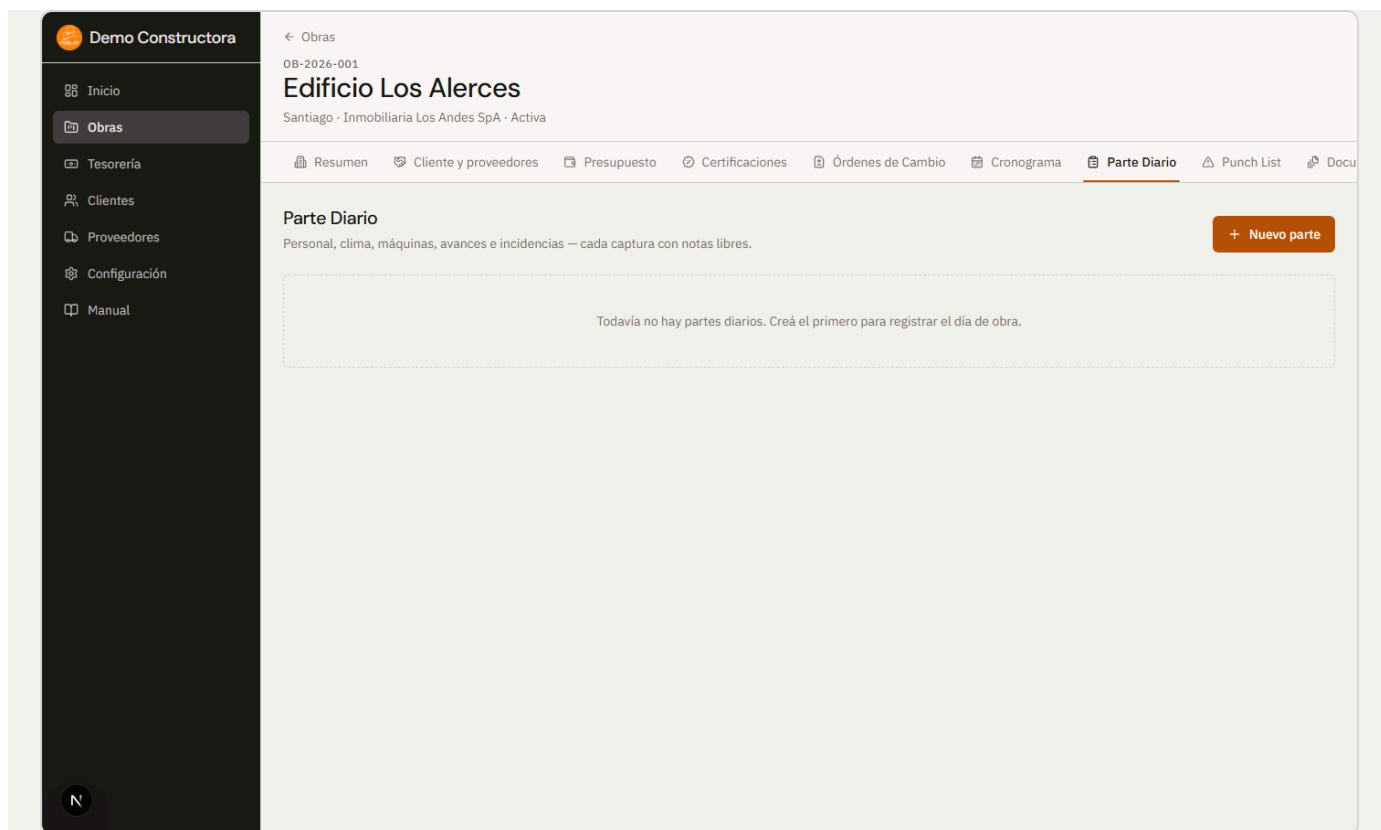

Parte diario




9. Punch List (observaciones)

Lista de pendientes / defectos con foto, prioridad, ubicación y responsable.

Cómo hacerlo

1. Obra → Punch List → Nueva observación.
2. Cargá título, ubicación, prioridad, responsable, vencimiento y fotos.
3. Pasá el estado: Pendiente → En proceso → Resuelto (o reabrí si hace falta).

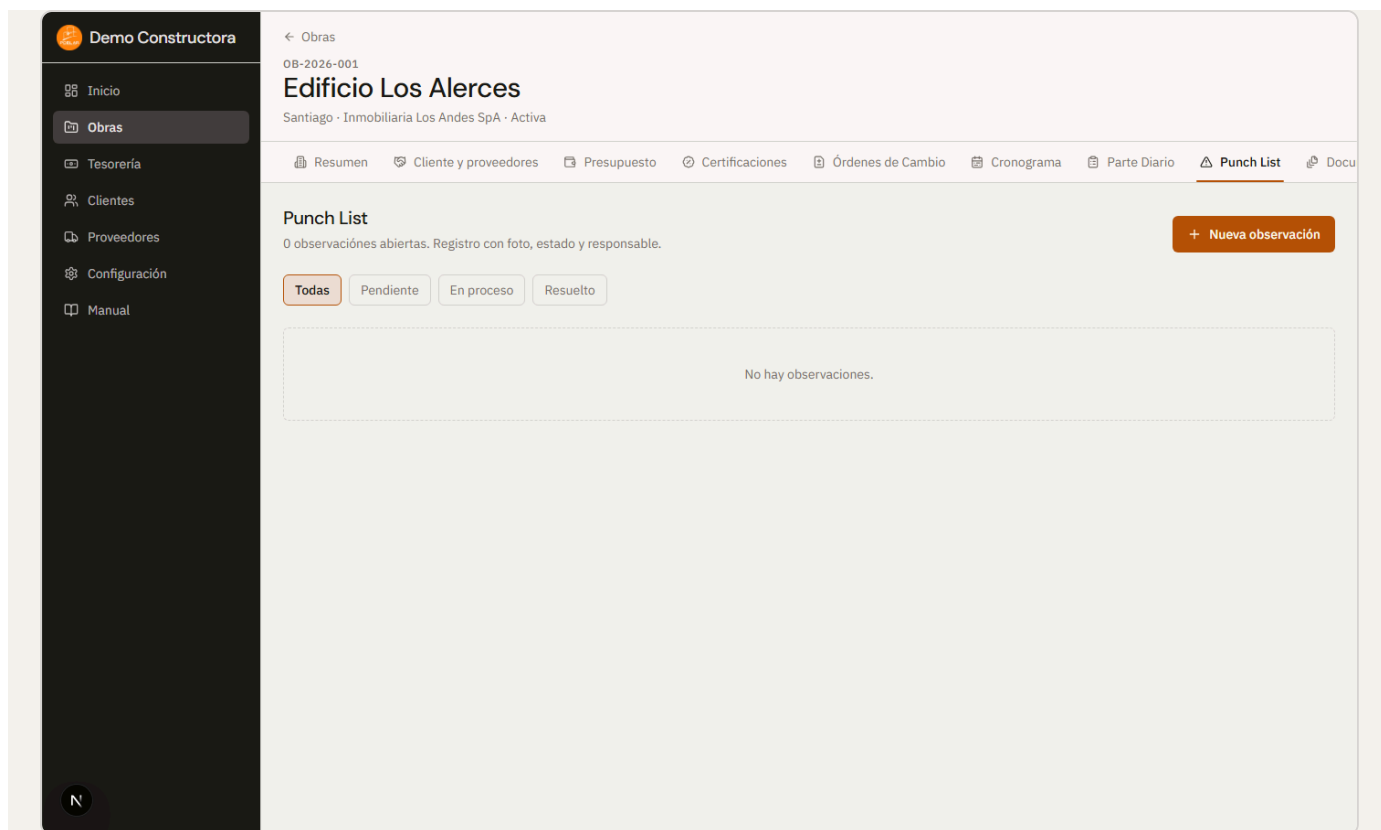

Punch List




10. Documentos

Repositorio de planos, contratos, especificaciones y demás archivos de la obra, con versiones.

Cómo hacerlo

1. Obra → Documentos → subir archivo.
2. Indicá título, tipo (plano, contrato, etc.) y categoría si aplica.
3. Podés subir una nueva versión del mismo documento cuando cambie el plano.

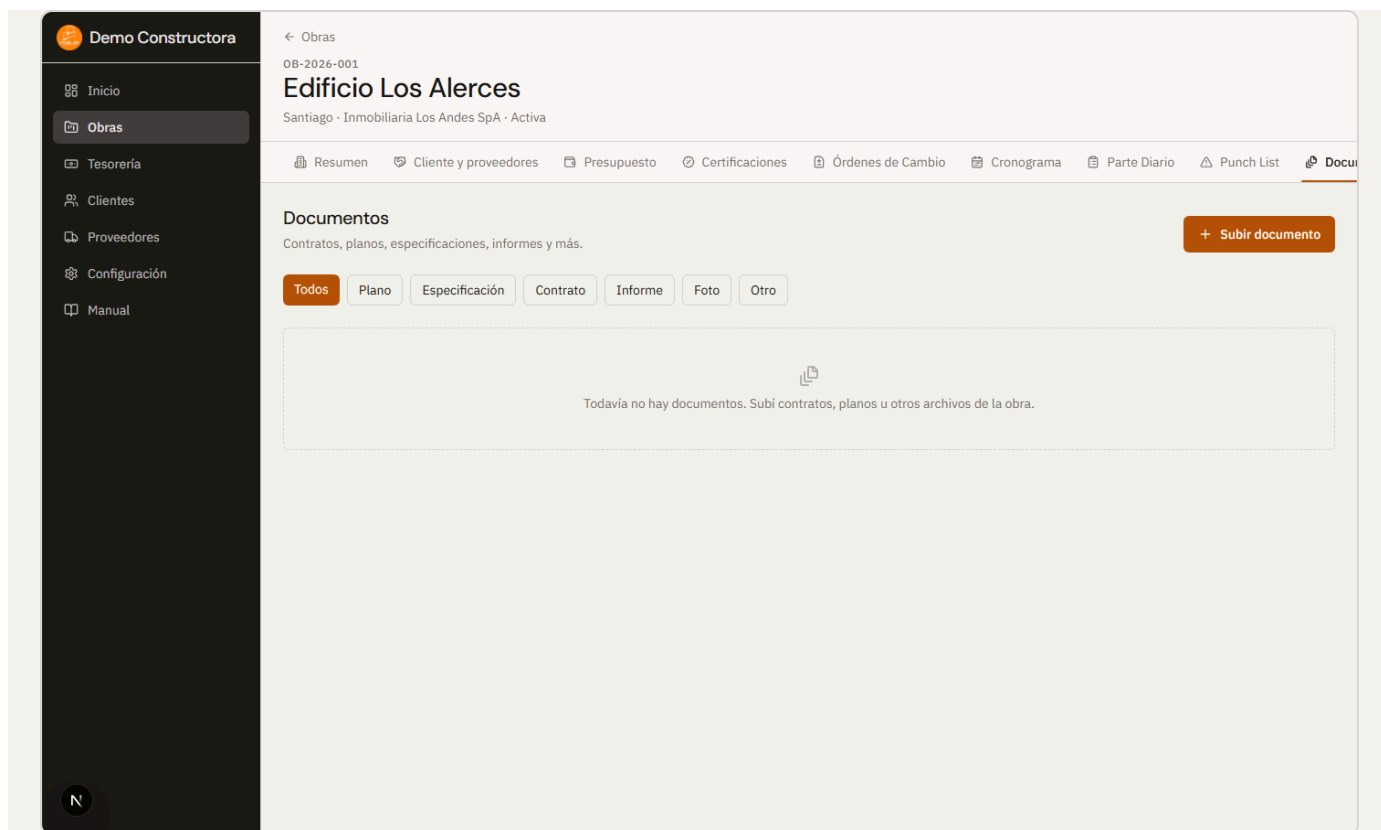

Documentos



11. Compras (facturas de proveedor)

Cargá facturas (PDF o foto). El sistema intenta leer datos y líneas; vos confirmás. Al confirmar, ingresa stock al inventario.

Cómo hacerlo

1. Obra → Compras → Nueva factura.
2. Subí el PDF/imagen, revisá proveedor, montos y líneas (categoría para inventario).
3. Cuando esté correcto: Confirmar. La factura queda bloqueada y el stock se actualiza.

TIPS

Estados: Borrador → Confirmada (o Cancelada).

Si la extracción automática falla, completá las líneas a mano.

Demo Constructora

Inicio

Obras

Tesorería

Clientes

Proveedores

Configuración

Manual

Obras

OB-2026-001

Edificio Los Alerces

Santiago · Inmobiliaria Los Andes SpA · Activa

Resumen

Ciente y proveedores

Presupuesto

Certificaciones

Órdenes de Cambio

Cronograma

Parte Diario

Punch List

Docu

Compras

Facturas de proveedores con desglose automático al subir el archivo.

CONFIRMADAS

\$ 0,00

FACTURAS

0

Subir factura de compra

PDF o imagen. El sistema desglosa automáticamente CUIT, número, fechas, IVA, total y líneas cuando el archivo lo permite.

Elegí o soltá el archivo acá

Subir y desglosar

+ Subir factura

Compras



12. Inventario

Stock agrupado por categoría. Entra al confirmar facturas; sale al registrar consumo del día.

Cómo hacerlo

1. Obra → Inventario para ver existencias.
2. Registrá consumo del día indicando cantidades usadas (opcionalmente ligado al parte diario).
3. Controlá que las facturas confirmadas tengan categorías en las líneas.

Demo Constructora

← Obras

OB-2026-001

Edificio Los Alerces

Santiago · Inmobiliaria Los Andes SpA · Activa

Resumen

Ciente y proveedores

Presupuesto

Certificaciones

Órdenes de Cambio

Cronograma

Parte Diario

Punch List

Docu

Inicio

Obras

Tesorería

Clientes

Proveedores

Configuración

Manual

ARTÍCULOS

0

CATEGORÍAS

0

BAJO MÍNIMO

0

Ir a compras / facturas

Todavía no hay stock. Confirmá una **factura de compra** para ingresar artículos al inventario.

Inventario



13. Tesorería: recibos y órdenes de pago

Recibos = cobros. Órdenes de pago = egresos. Al imputar, impactan ingreso/costo real de partidas si las líneas están asociadas.

Cómo hacerlo

1. Menú Tesorería → Recibos u Órdenes de pago.
2. Creá el documento: fecha, cliente/proveedor o nombre libre, medio de pago, moneda y líneas (obra/partida + monto).
3. Emitir (pasa a emitido) y luego Imputar (POSTED) para que cuente en el control financiero.
4. Si el medio es Efectivo, al imputar debe haber una caja diaria abierta en esa moneda: el movimiento entra/sale de la caja automáticamente.
5. Anular revierte el impacto presupuestario y, si era efectivo, el movimiento de caja.

TIPS

Estados: Borrador → Emitido → Imputado · Anulado.

Medios: transferencia, efectivo, cheque (con datos de cheque obligatorios).

Demo Constructora

Inicio

Obras

Tesorería

Cientes

Proveedores

Configuración

Manual

N

Tesorería

Recibos y órdenes de pago en ARS / USD (u otras monedas habilitadas).

INGRESOS

\$ 0,00

Imputados: \$ 0,00

EGRESOS

\$ 0,00

Imputados: \$ 0,00

MULTIMONEDA

Los totales se muestran por moneda (no se mezclan ARS con USD).

Caja

Diaria \$ 0,00 · Tesorería \$ 0,00

Nuevo recibo

Cobros en ARS o USD

Nueva orden de pago

Pagos en ARS o USD

Recibos

Ver todos

Órdenes de pago

Ver todas

Sin recibos aún.

Sin órdenes de pago aún.

Configuración

Configurará el tipo de cambio USD/ARS en Configuración si necesitás equivalencias.

Tesorería — resumen

Demo Constructora

Inicio

Obras

Tesorería

Cientes

Proveedores

Configuración

Manual

N


Tesorería

Recibos

+ Nuevo recibo

Todavía no hay recibos.

Recibos

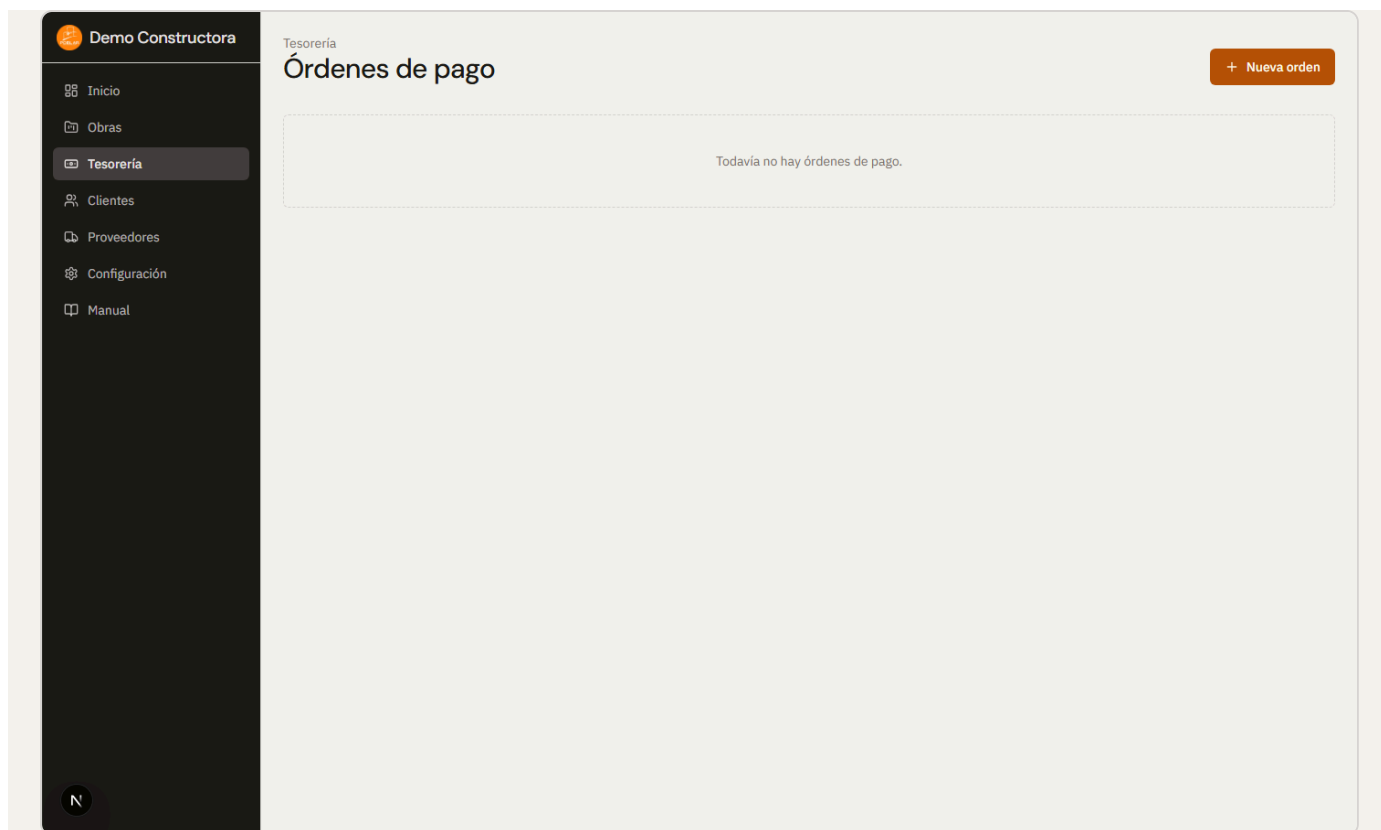

Órdenes de pago



14. Caja diaria y caja tesorería

Caja diaria operativa del día; al cerrar podés transferir el efectivo a la caja de tesorería (caja fuerte).

Cómo hacerlo

1. Tesorería → Caja → Abrir caja del día (fondo inicial y moneda).
2. Registrá ingresos/egresos/ajustes manuales, o imputá recibos/OP en efectivo.
3. Al final del día: Cerrar → arqueo (contado) → opcional transferir a tesorería.
4. Caja tesorería acumula esos cierres y permite depósitos/extracciones de control.

TIPS

Solo una caja diaria abierta por moneda a la vez.

Sin caja abierta no se puede imputar un recibo/OP en efectivo.

 Demo Constructora

Inicio

Obras

Tesorería

Cientes

Proveedores

Configuración

Manual

Tesorería

Caja

Caja diaria operativa y caja tesorería que acumula los cierres.

CAJA DIARIA

\$ 0,00

Sin sesión abierta

CAJA TESORERÍA

\$ 0,00

Ver movimientos y depósitos

Caja diaria

Abrió la caja del día con un fondo inicial. Al cerrar, el efectivo contado pasa a caja tesorería.

Fecha

24/07/2026

Fondo de apertura (ARS)

0

Notas

Opcional

Abrir caja diaria

Últimas sesiones

Todavía no hay sesiones de caja.

Movimientos recientes en tesorería

Ver caja tesorería

Los cierres diarios aparecerán acá.

Caja diaria

15. Configuración de la empresa

Datos de la constructora, logo, tema visual y tipo de cambio (p. ej. BNA USD/ARS).

Cómo hacerlo

1. Menú Configuración (Admin/Dirección).
2. Actualizá razón social, contacto y logo.
3. Revisá monedas y sincronizá o cargá la cotización USD/ARS cuando haga falta.

Configuración

Datos de la constructora, monedas (ARS/USD) y cotización BNA.

Identidad

Datos legales y de marca de la constructora.

Nombre comercial

Demo Constructora

Razón social

Demo Constructora S.A.

CUIT

30-71234567-8

País

AR

Formato XX-XXXXXXXX-X

Moneda principal (reporte)

Peso argentino (ARS)

Recomendadas: ARS o USD. El sistema es multimoneda.

Monedas habilitadas

ARS (habitual) USD (habitual) EUR UYU BRL

ARS y USD quedan siempre disponibles. Podés habilitar otras si las necesitás.

Logo

Choose File No file chosen

Quitar logo actual

Paleta de colores

Elegí una propuesta para personalizar la interfaz. Se aplica al guardar.

Obra ámbar

Hormigón claro con acento de seguridad industrial.

Acero

Grises fríos y azul estructural.

Bosque

Verdes de obra y piedra clara.

Grafito

Carbón con amarillo de señalización.

Arcilla

Tonos tierra y ladrillo quemado.

Señal

Negro industrial con naranja de obra.

Fuego

Menú naranja; contenido negro con tipografía naranja.

Mar

Turquesa de costa y arena fría.

Contacto

Dirección, teléfono y correo institucional.

Dirección

Bv España 99

Ciudad

Villa Maria

Provincia

Cordoba

Código postal

5900

Teléfono

Email

WhatsApp

+54 9 11 ...

Sitio web

https://

Redes sociales

URLs completas de cada perfil.

Facebook

https://facebook.com/...

Instagram

https://instagram.com/...

LinkedIn

https://linkedin.com/company/...

X (Twitter)

https://x.com/...

Guardar cambios

Tipos de cambio

Cotización automática del Banco Nación (USD→ARS). Cada día se genera un registro nuevo para el histórico.

Último USD → ARS: 1.520 (2026-07-24 · BNA venta 1520 / compra 1470 · monedapi-bna)

Actualizar desde BNA

De

USD

A

ARS

Cotización

1520

Vigencia

24/07/2026

Guardar cotización manual

Histórico reciente



16. Flujo recomendado del día a día

Orden sugerido para no trabarte con dependencias entre módulos.

Cómo hacerlo

1. Una sola vez: Configuración → Clientes y Proveedores → Crear obra → Vincular stakeholders → Cargar presupuesto y aprobarlo.
2. En obra: Cronograma y Documentos según avance del proyecto.
3. Cada día de campo: Parte diario + Punch list + Consumo de inventario.
4. Compras: subir y confirmar facturas (alimenta stock).
5. Cobros/pagos: Recibos y OP; si hay efectivo, abrí caja primero.
6. Fin de mes / hitos: Certificaciones y, si hubo extras, Órdenes de cambio.
7. Cierre de caja diaria → transferencia a tesorería.

TIPS

Subcontratas aún está en preparación (pantalla provisional).

Para practicar sin miedo, usá una obra de prueba vacía: se puede eliminar si no tiene datos.

¿Falta algo? Pedile a tu administrador que actualice este manual o que regenere las capturas.

[Volver al inicio](#)
